

回 答 書

令和 8年 5月 18日

富士吉田市役所 都市基盤部 建築営繕課

工事(業務)名 : 富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場空調設置他改修工事

上記の工事(業務)について別紙の通り質疑を受けましたので、下記のとおり回答いたします。

回 答

Q1. 中東情勢の緊迫化を背景とした資機材の急騰に対応したスライド条項の適用、及び資機材の納期遅れが発生した場合の工期延長は可能ですか。

A1. 工事請負約款に基づき、協議いたします。

Q2. A-09 新設壁について

①・断面詳細図を指示願います。

②・下地取り付け方法、カーテンBOX取り合い納まりを指示願います。

③・楕合板内訳書はt=4.0 図面はt=5.5となっておりますが、t=5.5は有りません。内訳書のt=4.0とさせていただきます。

A2. ①添付図面を参照ください。

②添付図面を参照ください。

③一般的にt=5.5の規格は流通しておりますので、再度ご確認の上、図面に基づき施工してください。

回答書

令和 8年 5月 18日

富士吉田市役所 都市基盤部 建築営繕課

工事(業務)名 : 富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場空調設置他改修工事

上記の工事(業務)について別紙の通り質疑を受けましたので、下記のとおり回答いたします。

回 答

Q3. A-24 男女便所改修工事

展開図等が無く理解出来ません。

床レベリングの厚さ、長尺シート

壁ー既存ブース撤去、新設(LGS50、フレキ、EP-G)天井まではどこですか。

ブース扉新設(H=1,800)仕様は何ですか。


内訳一式では、判断出来ません。各所、内訳、仕様を指示願います。

A3. 【床】レベリングの厚さ:50mm程度、長尺シート:2mm(トイレ、洗面所共)

【壁】既存のブースすべてが、撤去および新設の対象範囲となります。

【扉】フラッシュ戸、W600×H1,800、重力式丁番、表示錠

【その他】別添資料を参照ください。

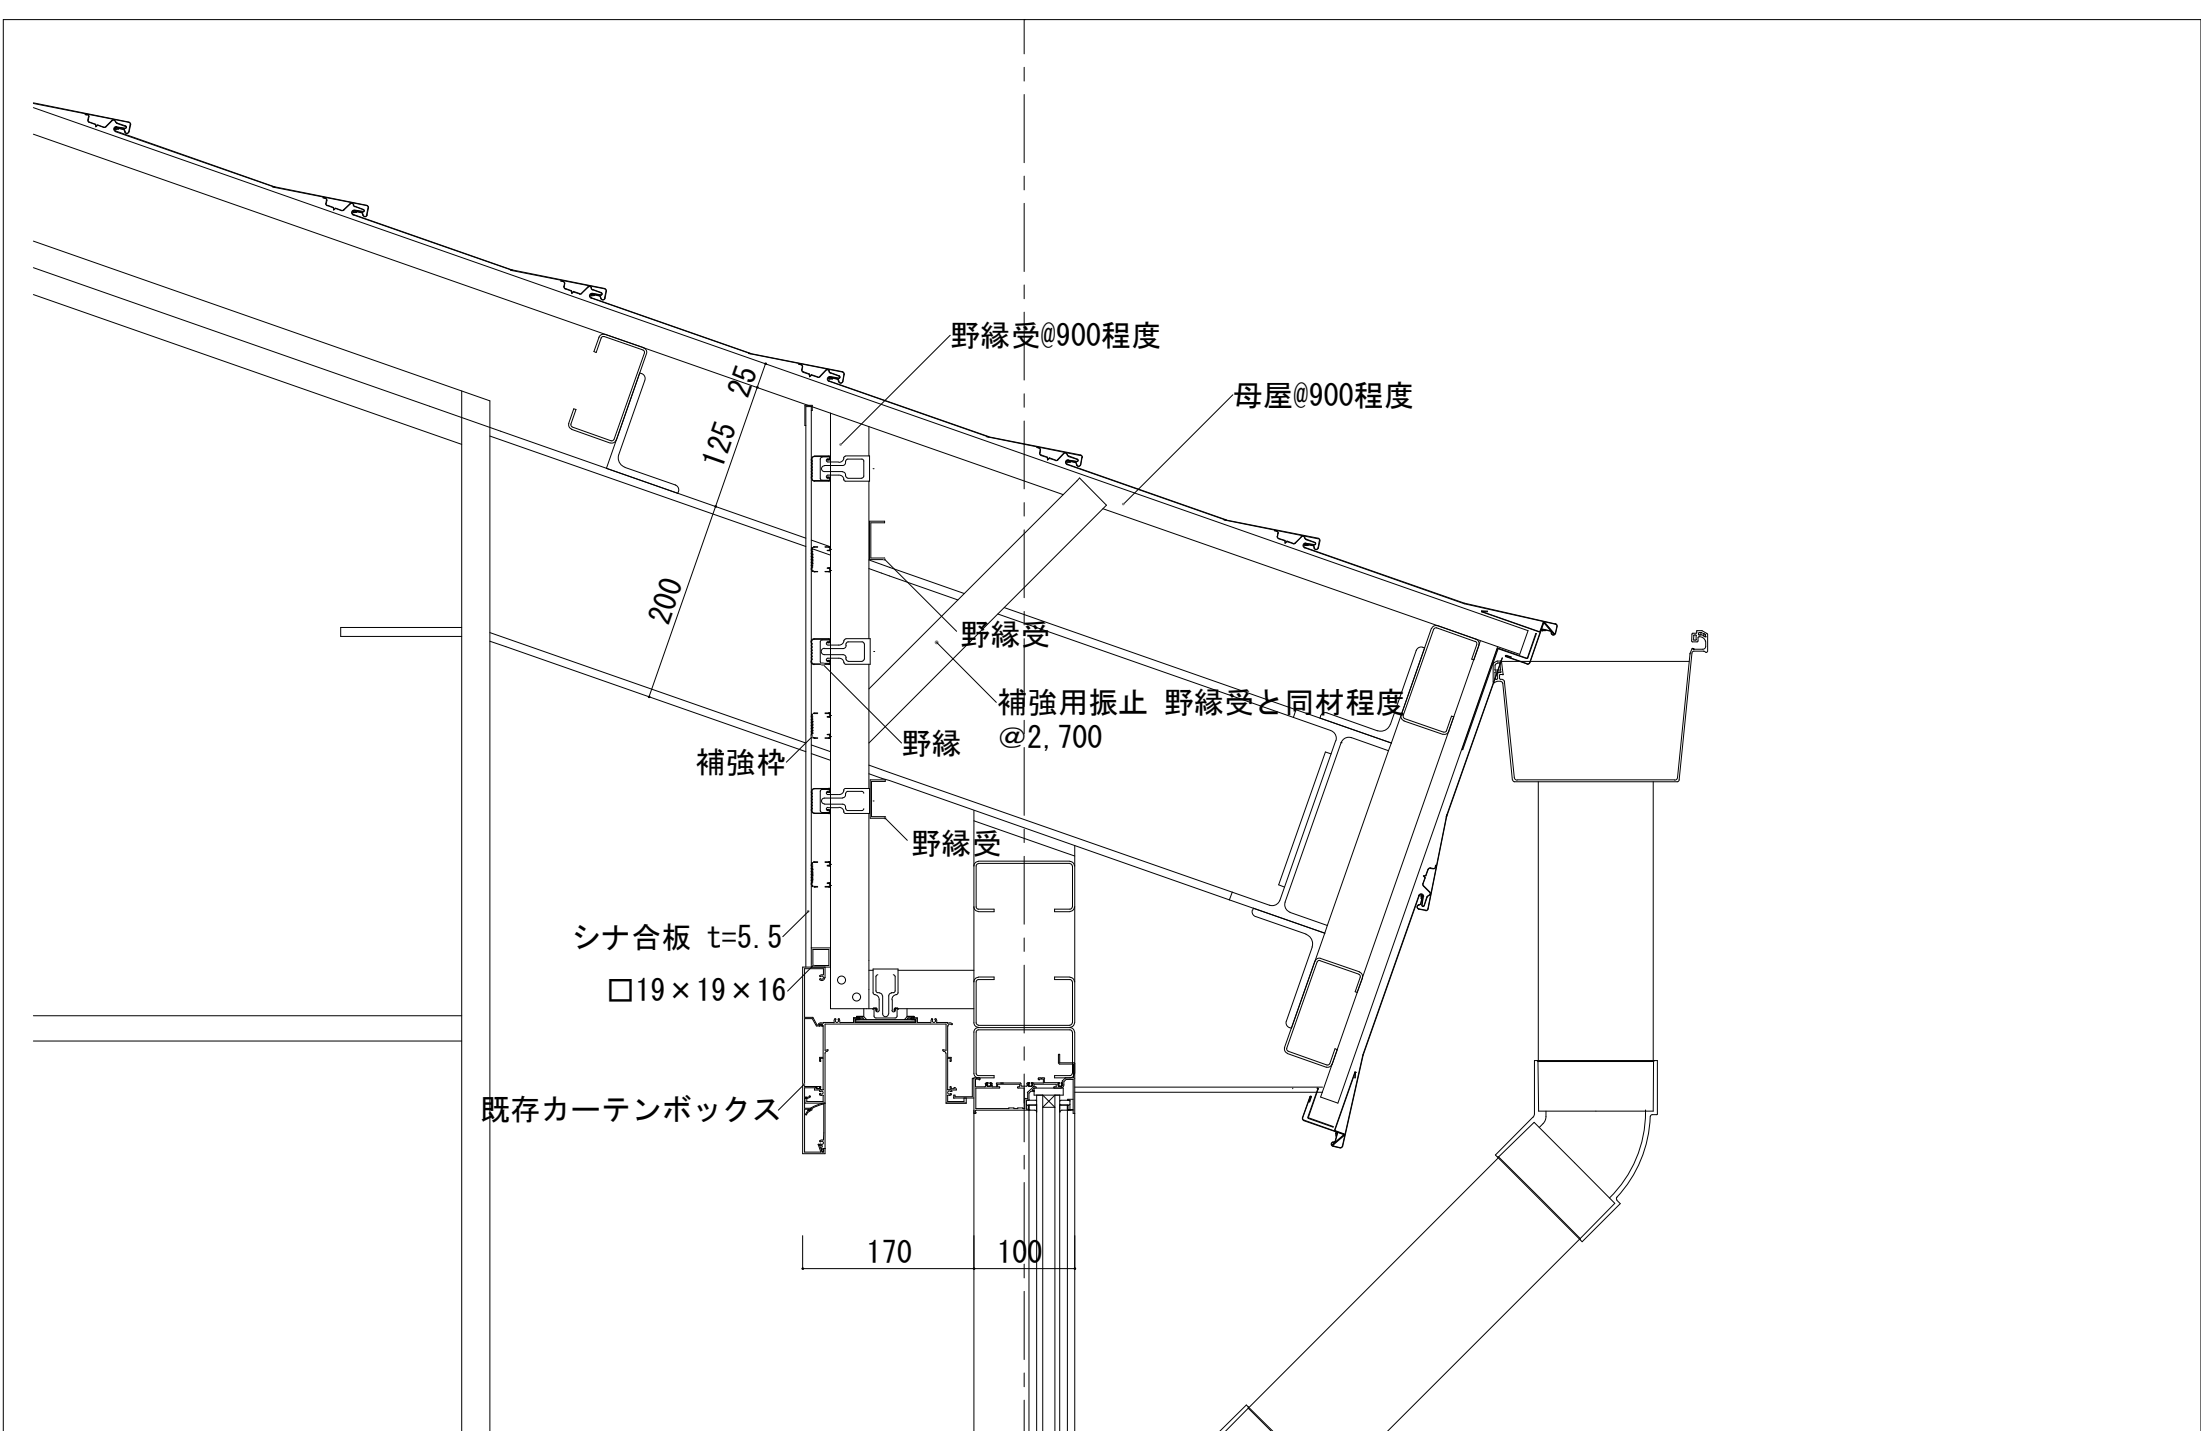

		工事名称	富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場空調設置他改修工事	No.
		工事区分名称	建築主体工事	A-26
		図面名称	詳細図	

工種	摘要	名称	品質寸法	単位	数量
男子トイレ改修					
		既存トイレブース撤去		式	1
		同上運搬、処分		式	1
		大便器取り外し・再取付		台	2
		床レベラー	12㎡程度	式	1
		壁LGS	W50 開口補強共	式	1
		壁フレキシブルボード	11.8㎡程度 t8	式	1
		同上塗装	EP-G	m2	12
		開口枠	加工取付共 木枠 30×100程度	丁	4
		同上塗装	OP	m	10
		床長尺シート張り	防汚・抗菌性 溶接共	m2	12
		ソフト巾木	H=60 新規トイレ間仕切	m	5
		既存壁塗装	EP-G	m2	36
		フラッシュ戸	トイレドア W600×H1800 重力式丁番 表示錠	本	2
男子洗面所					
		既存壁塗装	EP-G	m2	24
		既存床長尺シート撤去		m2	12
		床長尺シート張り	溶接共	m2	12
		ソフト巾木	H=60 新規トイレ間仕切	m	5
女子トイレ改修					
		既存トイレブース撤去		式	1
		同上運搬、処分		式	1
		大便器取り外し・再取付		台	3
		床レベラー	12㎡程度	式	1
		壁LGS	W50 開口補強共	式	1
		壁フレキシブルボード	20.6㎡程度 t8	式	1
		同上塗装	EP-G	m2	21
		開口枠	加工取付共 木枠 30×100程度	丁	6
		同上塗装	OP	m	15
		床長尺シート張り	防汚・抗菌性 溶接共	m2	12
		ソフト巾木	H=60 新規トイレ間仕切	m	8
		既存壁塗装	EP-G	m2	31
		フラッシュ戸	トイレドア W600×H1800 重力式丁番 表示錠	本	3
女子洗面所					
		既存壁塗装	EP-G	m2	24
		既存床長尺シート撤去		m2	12
		床長尺シート張り	溶接共	m2	12
		ソフト巾木	H=60 新規トイレ間仕切	m	5
